



Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Mateusza Ap.
ul. Ks. Jana Felskiego 1,
Góra, 84 - 252 Zamostne
tel. 58 572 06 00,
gpomorska@diecezja.gda.pl

W	ZW	SE	SK	RF	OR
RGP	URZĄD GMINY WEJHEROWO W P Ł Y N Ę Ł O				GOPS
AW	29-11-2019				IODO
RGN	Nr sprawy ... 1243/19005				BCK
RP					RZP IFZ
RSO	RIGK	RIS	ROSS	INF	RZK

Urząd Gminy Wejherowo
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Sprawozdanie z udzielonej dotacji
na prace konserwatorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Kościół p.w. św. Mateusza Apostoła w Górze, Gmina Wejherowo.
Nr w rejestrze zabytków: A 1251 – obecnie pod numerem A/1757
(nazwa podmiotu)

zawartej w dniu 12. czerwca 2019r.

między Gminą Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6,
a Parafią p.w. św. Mateusza Apostoła w Górze, ul. Ks. Felskiego 1

na zadanie: „Remont pokrycia kopuły wieży kościoła.”

Data złożenia sprawozdania: 29. XI. 2019r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne.

1. Czy zakładane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie - dlaczego?

Zaplanowane zadania wykonano w całości pod nadzorem i wg wytycznych konserwatora zabytków.

2. Opis wykonania robót.

Usunięto ogniska rdzy. Następnie szczotkowano, szlifowano zmatowiono i odłuszczone całą powierzchnię kopuły.
Wszystko pomalowano dwukrotnie farbą na powierzchnie ocynkowane.

Cześć II. Sprawozdanie z wykonania wydatków.

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów.

Lp	Rodzaj kosztów	Koszt zadania (zgodnie z umowa)			Koszty narastająco za poprzednie okresy sprawozdawcze			Koszty w bieżącym okresie sprawozdawczym (w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania)		
		Koszt całkowity (zł)	Dotacja (zł)	Środki własne, środki z innych źródeł (zł)	Koszt całkowity (zł)	Dotacja (zł)	Środki własne, środki z innych źródeł	Koszt całkowity (zł)	Dotacja (zł)	Środki własne, środki z innych źródeł (zł)
1	czyszczenie malowanie materiały nadzór	26 525	10 000	10 000 6 525						
	ogółem	26 525	10 000	16 525				26 525	10 000	16 525

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania.

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	10 000	37,7				
Koszty pokryte z finansowych środków własnych	6 525	24,6				
Koszty pokryte z innych źródeł	10 000	37,7				
Ogółem	26 525	100				

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Kierownik nadzoru ma wymagane uprawnienia konserwatorskie.

Wykonanie zatwierdził przedstawiciel Konserwatora Wojewódzkiego.

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Numer księgowy	Numer pozycji kosztorysu	Data wystawienia rachunku	Nazwa wydatku	Kwota zł.	Wysokość środków z dotacji finansujących rachunek
1.	1/2019	29.09.2019	Rachunek nr 9 MP Marek Negowski, Rumia	12 000	10 000
2.	2/2019	07.10.2019	Rachunek Nr 10 MP Marek Negowski, Rumia	14 522	
			razem:	26 522	10 000 zł.

Część III. Dodatkowe informacje.

- Załączniki:
1. Kopie rachunków i przelewów bankowych.
 2. Kopia protokołu z odbioru prac.
 3. Ilustracje.

Oświadczam że:

- Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy ,
- 1) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
 - 2) Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Praw zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),
 - 3) Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione




Henryk Osowicki
 (podpis osoby upoważnionej do składania
 oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)
 PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE
 ZCZS02014

Poświadczenie złożenia sprawozdania:

SKARBNIK GMINY
mgr Witold Ciemięga

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

„Kopuła wieży kościoła w Górze - 2019 r.

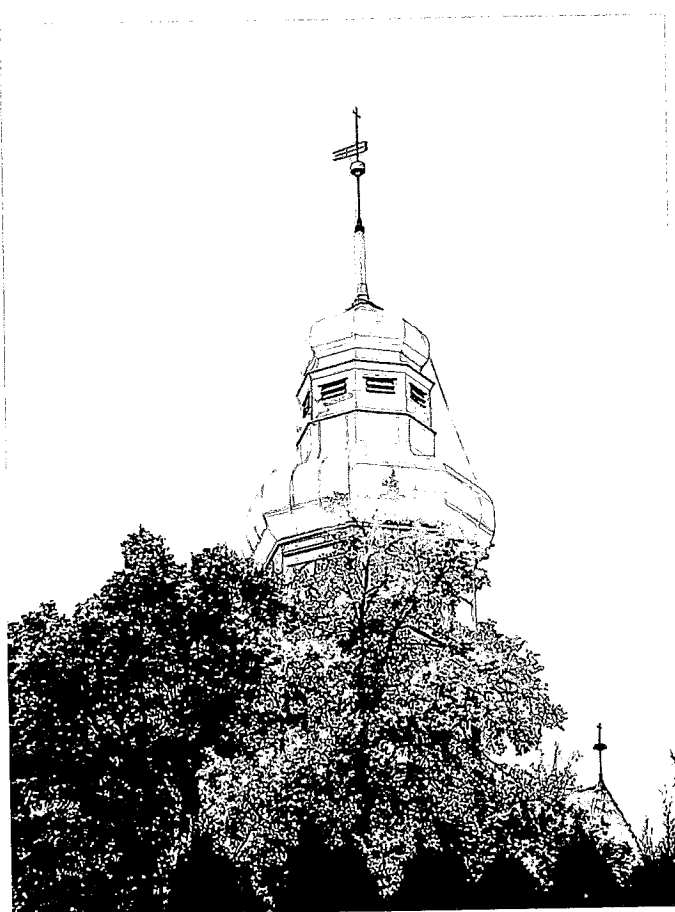

Gdańsk, dnia 6.11.2019 r.

PROTOKÓŁ NR 12 /2019

z odbioru prac przeprowadzonych przy obiekcie zabytkowym

Kościół Parafialny pw. Św. Mateusza w Górze
gm. Wejherowo nr rej. 1251 (oryg. nr 1757) decyzja
PWiK z dn. 9.05.2005r. Rbpa Budowlana - remont podłóg
dachowych kopuły wieży kościoła. Decyzja ZNS 12.843.2019.KZ.
z dn. 27.12.2019

Odbiór przeprowadzili:

1. Janina Bawndi - Inspektor WUOZ Gdańsk
2.

jako przedstawiciele WUOZ w Gdańsku

przy udziale:

1. Janina Ogórczyk - Proboszcz Parafii
2.

w obecności:

1. Engländer Czesław - Kierownik Budowy
2.

Przedmiot odbioru:

Prace budowlane - remontowe - kościół
Parafialny pw. Św. Mateusza w Górze
- decyzja ZN 5142/843.1/2019 z dn. 6.11.2019

Ustalenia z odbioru:

Prace wykonano zgodnie ze sztuką
budowlaną, konserwatorską oraz
miejscowym pozwoleniem
Odbiór prac bez zastrzeżeń

[Handwritten signature]

Stanowisko właściciela / administratora obiektu:

Bożena

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy pracowników
WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Gdańsku
ul. Dąbrowskiego 2/1, 80-852 Gdańsk

[Handwritten signature]
2.

Podpis właściciela/
administratora obiektu

1. *[Handwritten signature]*
2.

PROBOSZCZ
Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. św. Mateusza Apostoła
GÓRA

Podpis osoby biorącej udział
w odbiorze prac

1. *[Handwritten signature]*
2.
